


پروژه 160 واحدی مسکن مهر شهر پرنده

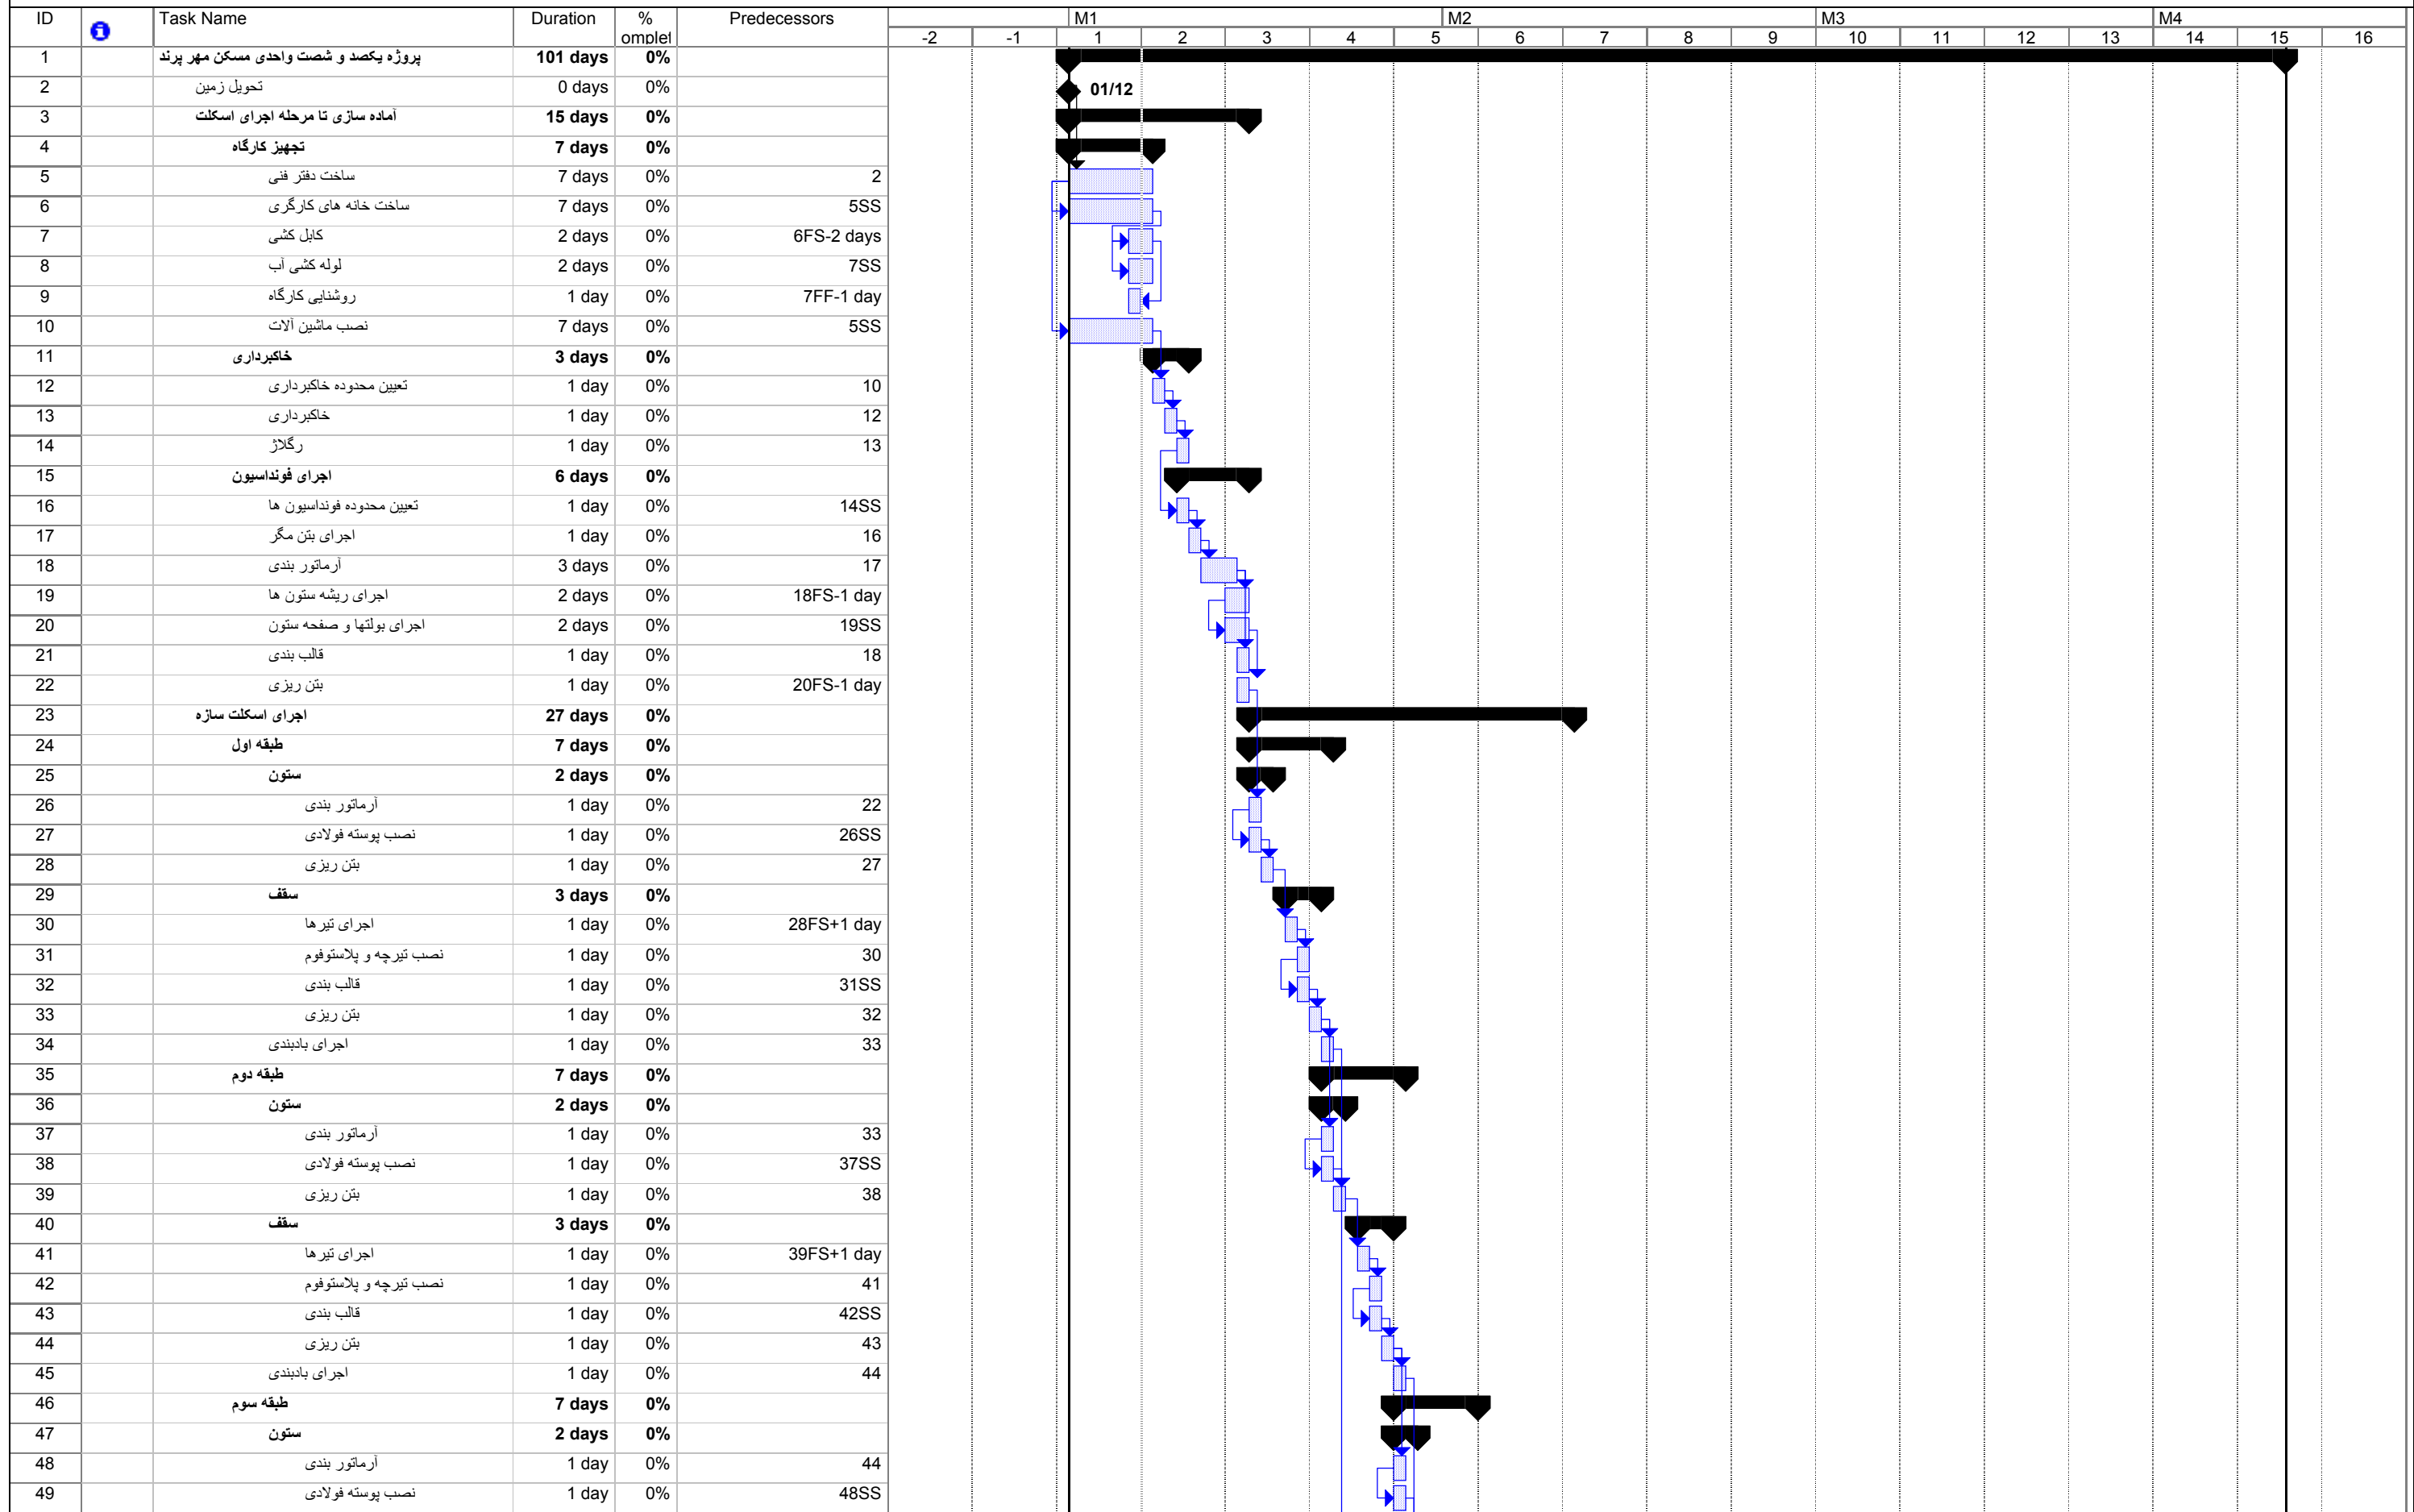

Project: پرنده
Date: Mon 07/12/09

Task		Progress		Summary		External Tasks		Deadline	
Split		Milestone		Project Summary		External Milestone			

پروژه 160 واحدی مسکن مهر شهر پرنده

ID	Task Name	Duration	% omplet	Predecessors	M1		M2				M3				M4						
					-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	بتن ریزی	1 day	0%	49																	
51	سقف	3 days	0%																		
52	اجرای تیرها	1 day	0%	50FS+1 day																	
53	نصب تیرچه و پلاستوفوم	1 day	0%	52																	
54	قالب بندی	1 day	0%	53SS																	
55	بتن ریزی	1 day	0%	54																	
56	اجرای بادبندی	1 day	0%	55																	
57	طبقه چهارم	7 days	0%																		
58	ستون	2 days	0%																		
59	آرماتور بندی	1 day	0%	55																	
60	نصب پوسته فولادی	1 day	0%	59SS																	
61	بتن ریزی	1 day	0%	60																	
62	سقف	3 days	0%																		
63	اجرای تیرها	1 day	0%	61FS+1 day																	
64	نصب تیرچه و پلاستوفوم	1 day	0%	63																	
65	قالب بندی	1 day	0%	64SS																	
66	بتن ریزی	1 day	0%	65																	
67	اجرای بادبندی	1 day	0%	66																	
68	خرپشته	3 days	0%																		
69	ستون	1 day	0%																		
70	آرماتور بندی	1 day	0%	66																	
71	نصب پوسته فولادی	1 day	0%	70SS																	
72	بتن ریزی	1 day	0%	71FS-1 day																	
73	سقف	2 days	0%																		
74	اجرای تیرها	1 day	0%	72																	
75	نصب تیرچه و پلاستوفوم	1 day	0%	74																	
76	قالب بندی	1 day	0%	75SS																	
77	بتن ریزی	1 day	0%	76FS-1 day																	
78	اجرای بادبندی	1 day	0%	77FS-1 day																	
79	اجرای دیوار ها	33 days	0%																		
80	طبقه اول	14 days	0%																		
81	نصب پانل ها	2 days	0%	34																	
82	لوله کشی آب و فاضلاب	4 days	0%	81FS-1 day																	
83	برق کشی	3 days	0%	82FS-2 days																	
84	سیمان کشی روی لوله های برق و آب	2 days	0%	82FS-2 days																	
85	اجرای لوله کشی گاز	3 days	0%	84FS-1 day																	
86	اجرای کانال کولر	2 days	0%	85FS-2 days																	
87	سیمان پاشی دیوار های طبقه اول	2 days	0%	86																	
88	نصب چهارچوب های درها	2 days	0%	87																	
89	نصب چهارچوب پنجره ها	1 day	0%	88																	
90	نصب پنجره های (UPVC)	2 days	0%	89																	
91	طبقه دوم	15 days	0%																		
92	نصب پانل ها	2 days	0%	45																	
93	لوله کشی آب و فاضلاب	4 days	0%	92FS-1 day																	
94	برق کشی	3 days	0%	93FS-2 days																	
95	سیمان کشی روی لوله های برق و آب	2 days	0%	93FS-2 days																	
96	اجرای لوله کشی گاز	3 days	0%	95																	
97	اجرای کانال کولر	2 days	0%	96FS-2 days																	
98	سیمان پاشی دیوار های طبقه دوم	2 days	0%	97																	

Project: پرنده
Date: Mon 07/12/09

Task Progress Summary External Tasks Deadline

Split Milestone Milestone Project Summary External Milestone

پروژه 160 واحدی مسکن مهر شهر پرنده

ID	Task Name	Duration	% omplet	Predecessors	M1		M2				M3				M4						
					-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	نصب چهارچوب های درها	2 days	0%	98																	
100	نصب چهارچوب پنجره ها	1 day	0%	99																	
101	نصب پنجره های (UPVC)	2 days	0%	100																	
102	طبقه سوم	15 days	0%																		
103	نصب پانل ها	2 days	0%	56																	
104	لوله کشی آب و فاضلاب	4 days	0%	103FS-1 day																	
105	برق کشی	3 days	0%	104FS-2 days																	
106	سیمان کشی روی لوله های برق و آب	2 days	0%	104FS-2 days																	
107	اجرای لوله کشی گاز	3 days	0%	106																	
108	اجرای کانال کولر	2 days	0%	107FS-2 days																	
109	سیمان پاشی دیوارهای طبقه سوم	2 days	0%	108																	
110	نصب چهارچوب های درها	2 days	0%	109																	
111	نصب چهارچوب پنجره ها	1 day	0%	110																	
112	نصب پنجره های (UPVC)	2 days	0%	111																	
113	طبقه چهارم	15 days	0%																		
114	نصب پانل ها	2 days	0%	67																	
115	لوله کشی آب و فاضلاب	4 days	0%	114FS-1 day																	
116	برق کشی	3 days	0%	115FS-2 days																	
117	سیمان کشی روی لوله های برق و آب	2 days	0%	115FS-2 days																	
118	اجرای لوله کشی گاز	3 days	0%	117																	
119	اجرای کانال کولر	2 days	0%	118FS-2 days																	
120	سیمان پاشی دیوارهای طبقه چهارم	2 days	0%	119																	
121	نصب چهارچوب های درها	2 days	0%	120																	
122	نصب چهارچوب پنجره ها	1 day	0%	121																	
123	نصب پنجره های (UPVC)	2 days	0%	122																	
124	خرپشته	5 days	0%																		
125	نصب پانل ها	1 day	0%	78,116																	
126	برق کشی	1 day	0%	125																	
127	سیمان کشی روی لوله های برق و آب	1 day	0%	126																	
128	سیمان پاشی دیوارهای خرپشته	1 day	0%	127																	
129	نصب چهارچوب های درها	1 day	0%	128																	
130	نصب چهارچوب پنجره ها	1 day	0%	129FS-1 day																	
131	اجرای سقف کاذب	20 days	0%																		
132	طبقه اول	1 day	0%	88																	
133	طبقه دوم	1 day	0%	132,99																	
134	طبقه سوم	1 day	0%	133,110																	
135	طبقه چهارم	1 day	0%	134,121																	
136	کف سازی طبقات	22 days	0%																		
137	طبقه اول	2 days	0%	88,132FS+1 day																	
138	طبقه دوم	2 days	0%	133,99FS+1 day																	
139	طبقه سوم	2 days	0%	110,134FS+1 day																	
140	طبقه چهارم	2 days	0%	135,121FS+1 day																	
141	کف سازی بام	2 days	0%	140																	
142	عایق کاری رطوبتی	22 days	0%																		
143	طبقه اول	1 day	0%	88,132FS+1 day,137																	
144	طبقه دوم	1 day	0%	133,99FS+1 day,138																	
145	طبقه سوم	1 day	0%	110,134FS+1 day,139																	
146	طبقه چهارم	1 day	0%	135,121FS+1 day,140																	
147	عایق بام	2 days	0%	146,141																	


Project: پرنده
Date: Mon 07/12/09

Task: Progress: Summary: External Tasks: Deadline:

Split: Milestone: Project Summary: External Milestone:

پروژه 160 واحدی مسکن مهر شهر پرنده

ID	Task Name	Duration	% omplet	Predecessors	M1		M2		M3		M4											
					-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
148	کاشی کاری	22 days	0%																			
149	طبقه اول	4 days	0%	143																		
150	طبقه دوم	4 days	0%	144																		
151	طبقه سوم	4 days	0%	145																		
152	طبقه چهارم	4 days	0%	146																		
153	سرامیک کاری سرویس ها	21 days	0%																			
154	طبقه اول	3 days	0%	149																		
155	طبقه دوم	3 days	0%	150																		
156	طبقه سوم	3 days	0%	151																		
157	طبقه چهارم	3 days	0%	152																		
158	موزاییک کاری	25 days	0%																			
159	طبقه اول	7 days	0%	154																		
160	طبقه دوم	7 days	0%	155																		
161	طبقه سوم	7 days	0%	156																		
162	طبقه چهارم	7 days	0%	157																		
163	اجرای سنگ قرنیز	19 days	0%																			
164	طبقه اول	1 day	0%	159																		
165	طبقه دوم	1 day	0%	160																		
166	طبقه سوم	1 day	0%	161																		
167	طبقه چهارم	1 day	0%	162																		
168	اجرای سنگ کف پنجره	21 days	0%																			
169	طبقه اول	1 day	0%	89																		
170	طبقه دوم	1 day	0%	100																		
171	طبقه سوم	1 day	0%	111																		
172	طبقه چهارم	1 day	0%	122																		
173	سنگ درپوش	1 day	0%	172																		
174	اجرای سنگ پله	20 days	0%																			
175	طبقه اول	1 day	0%	159FS-2 days																		
176	طبقه دوم	1 day	0%	160FS-2 days																		
177	طبقه سوم	1 day	0%	161FS-2 days																		
178	طبقه چهارم	1 day	0%	162FS-2 days																		
179	خریشته	1 day	0%	178,147																		
180	اجرای نما	23 days	0%																			
181	طبقه اول	4 days	0%	169FS+1 day,90																		
182	طبقه دوم	4 days	0%	170FS+1 day,101																		
183	طبقه سوم	4 days	0%	171FS+1 day,112																		
184	طبقه چهارم	4 days	0%	172FS+1 day,123																		
185	اجرای گچ کاری	39 days	0%																			
186	طبقه اول	16 days	0%	164,181,160																		
187	طبقه دوم	16 days	0%	165FS+2 days,182,161																		
188	طبقه سوم	16 days	0%	166,183,186,162																		
189	طبقه چهارم	16 days	0%	167,184,187																		
190	نصب نرده	25 days	0%																			
191	طبقه اول	2 days	0%	186																		
192	طبقه دوم	2 days	0%	187																		
193	طبقه سوم	2 days	0%	188																		
194	طبقه چهارم	2 days	0%	189																		
195	نصب درها	27 days	0%																			
196	طبقه اول	4 days	0%	186																		

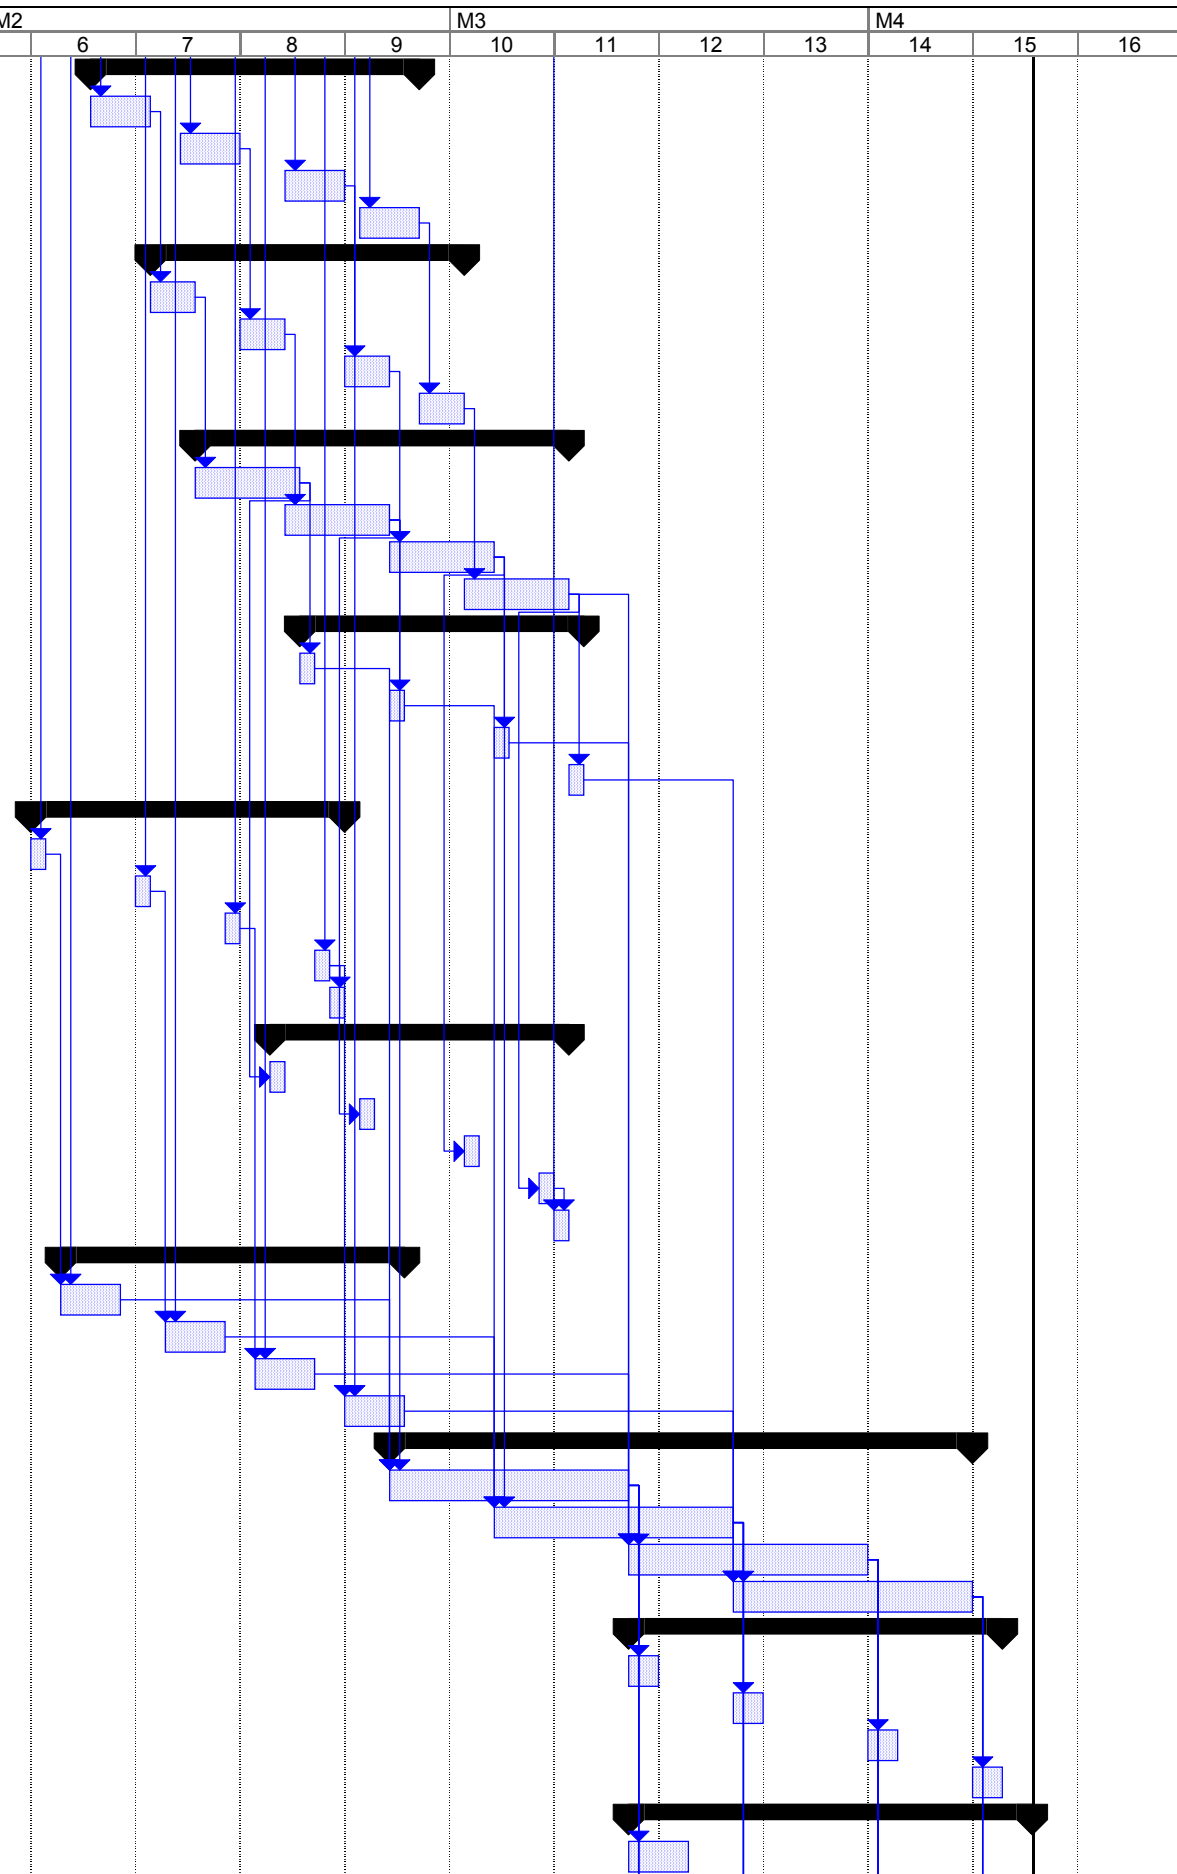


Project: پرنده
Date: Mon 07/12/09

Task		Progress		Summary		External Tasks		Deadline	
Split		Milestone		Project Summary		External Milestone			

پروژه 160 واحدی مسکن مهر شهر پرند

ID	Task Name	Duration	% omplet	Predecessors	M1		M2		M3		M4											
					-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
197	طبقه دوم	4 days	0%	187																		
198	طبقه سوم	4 days	0%	188																		
199	طبقه چهارم	4 days	0%	189																		
200	نصب شیرالات و کابینت	27 days	0%																			
201	طبقه اول	4 days	0%	186																		
202	طبقه دوم	4 days	0%	187																		
203	طبقه سوم	4 days	0%	188																		
204	طبقه چهارم	4 days	0%	189																		
205	نصب کلید پریز ها	27 days	0%																			
206	طبقه اول	4 days	0%	186																		
207	طبقه دوم	4 days	0%	187																		
208	طبقه سوم	4 days	0%	188																		
209	طبقه چهارم	4 days	0%	189																		
210	نصب شیشه ها	25 days	0%																			
211	طبقه اول	2 days	0%	186																		
212	طبقه دوم	2 days	0%	187																		
213	طبقه سوم	2 days	0%	188																		
214	طبقه چهارم	2 days	0%	189																		

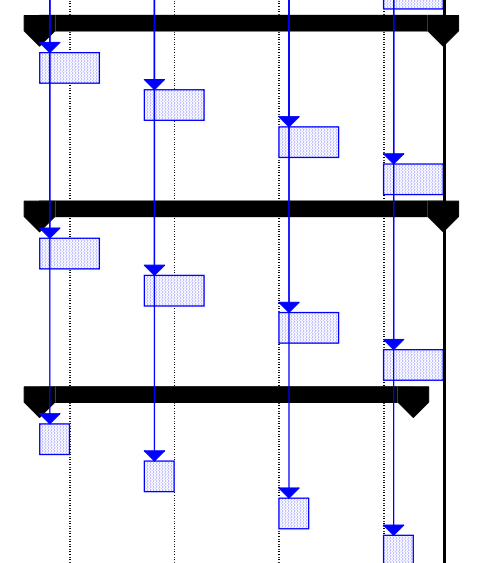

Project: پرند
Date: Mon 07/12/09

Task		Progress		Summary		External Tasks		Deadline	
Split		Milestone		Project Summary		External Milestone			
